


(08.02)

Übersicht:



Auftrag Nr. 20068	Auftraggeber:	Projektverfasser:
Plan Nr. 20068_25_1	 Aare Seeland mobil AG Grubenstrasse 12 4900 Langenthal Gesamtprojektleiter / Projektleiter: Martin Mühlethaler Telefon 058 329 93 93 martin.muehlethaler@asmobil.ch 	 IG CESO c/o c+s ingenieure ag Kalchhofenstrasse 20 3415 Hasle b.B. Projektleiter: Stephan Steiner Telefon 034 460 26 26 stephan.steiner@casing.ch
Datum: 17.09.2025		
Format: 630 x 297 mm		
gez/kontr: CBI / SST		
Änderungen:		

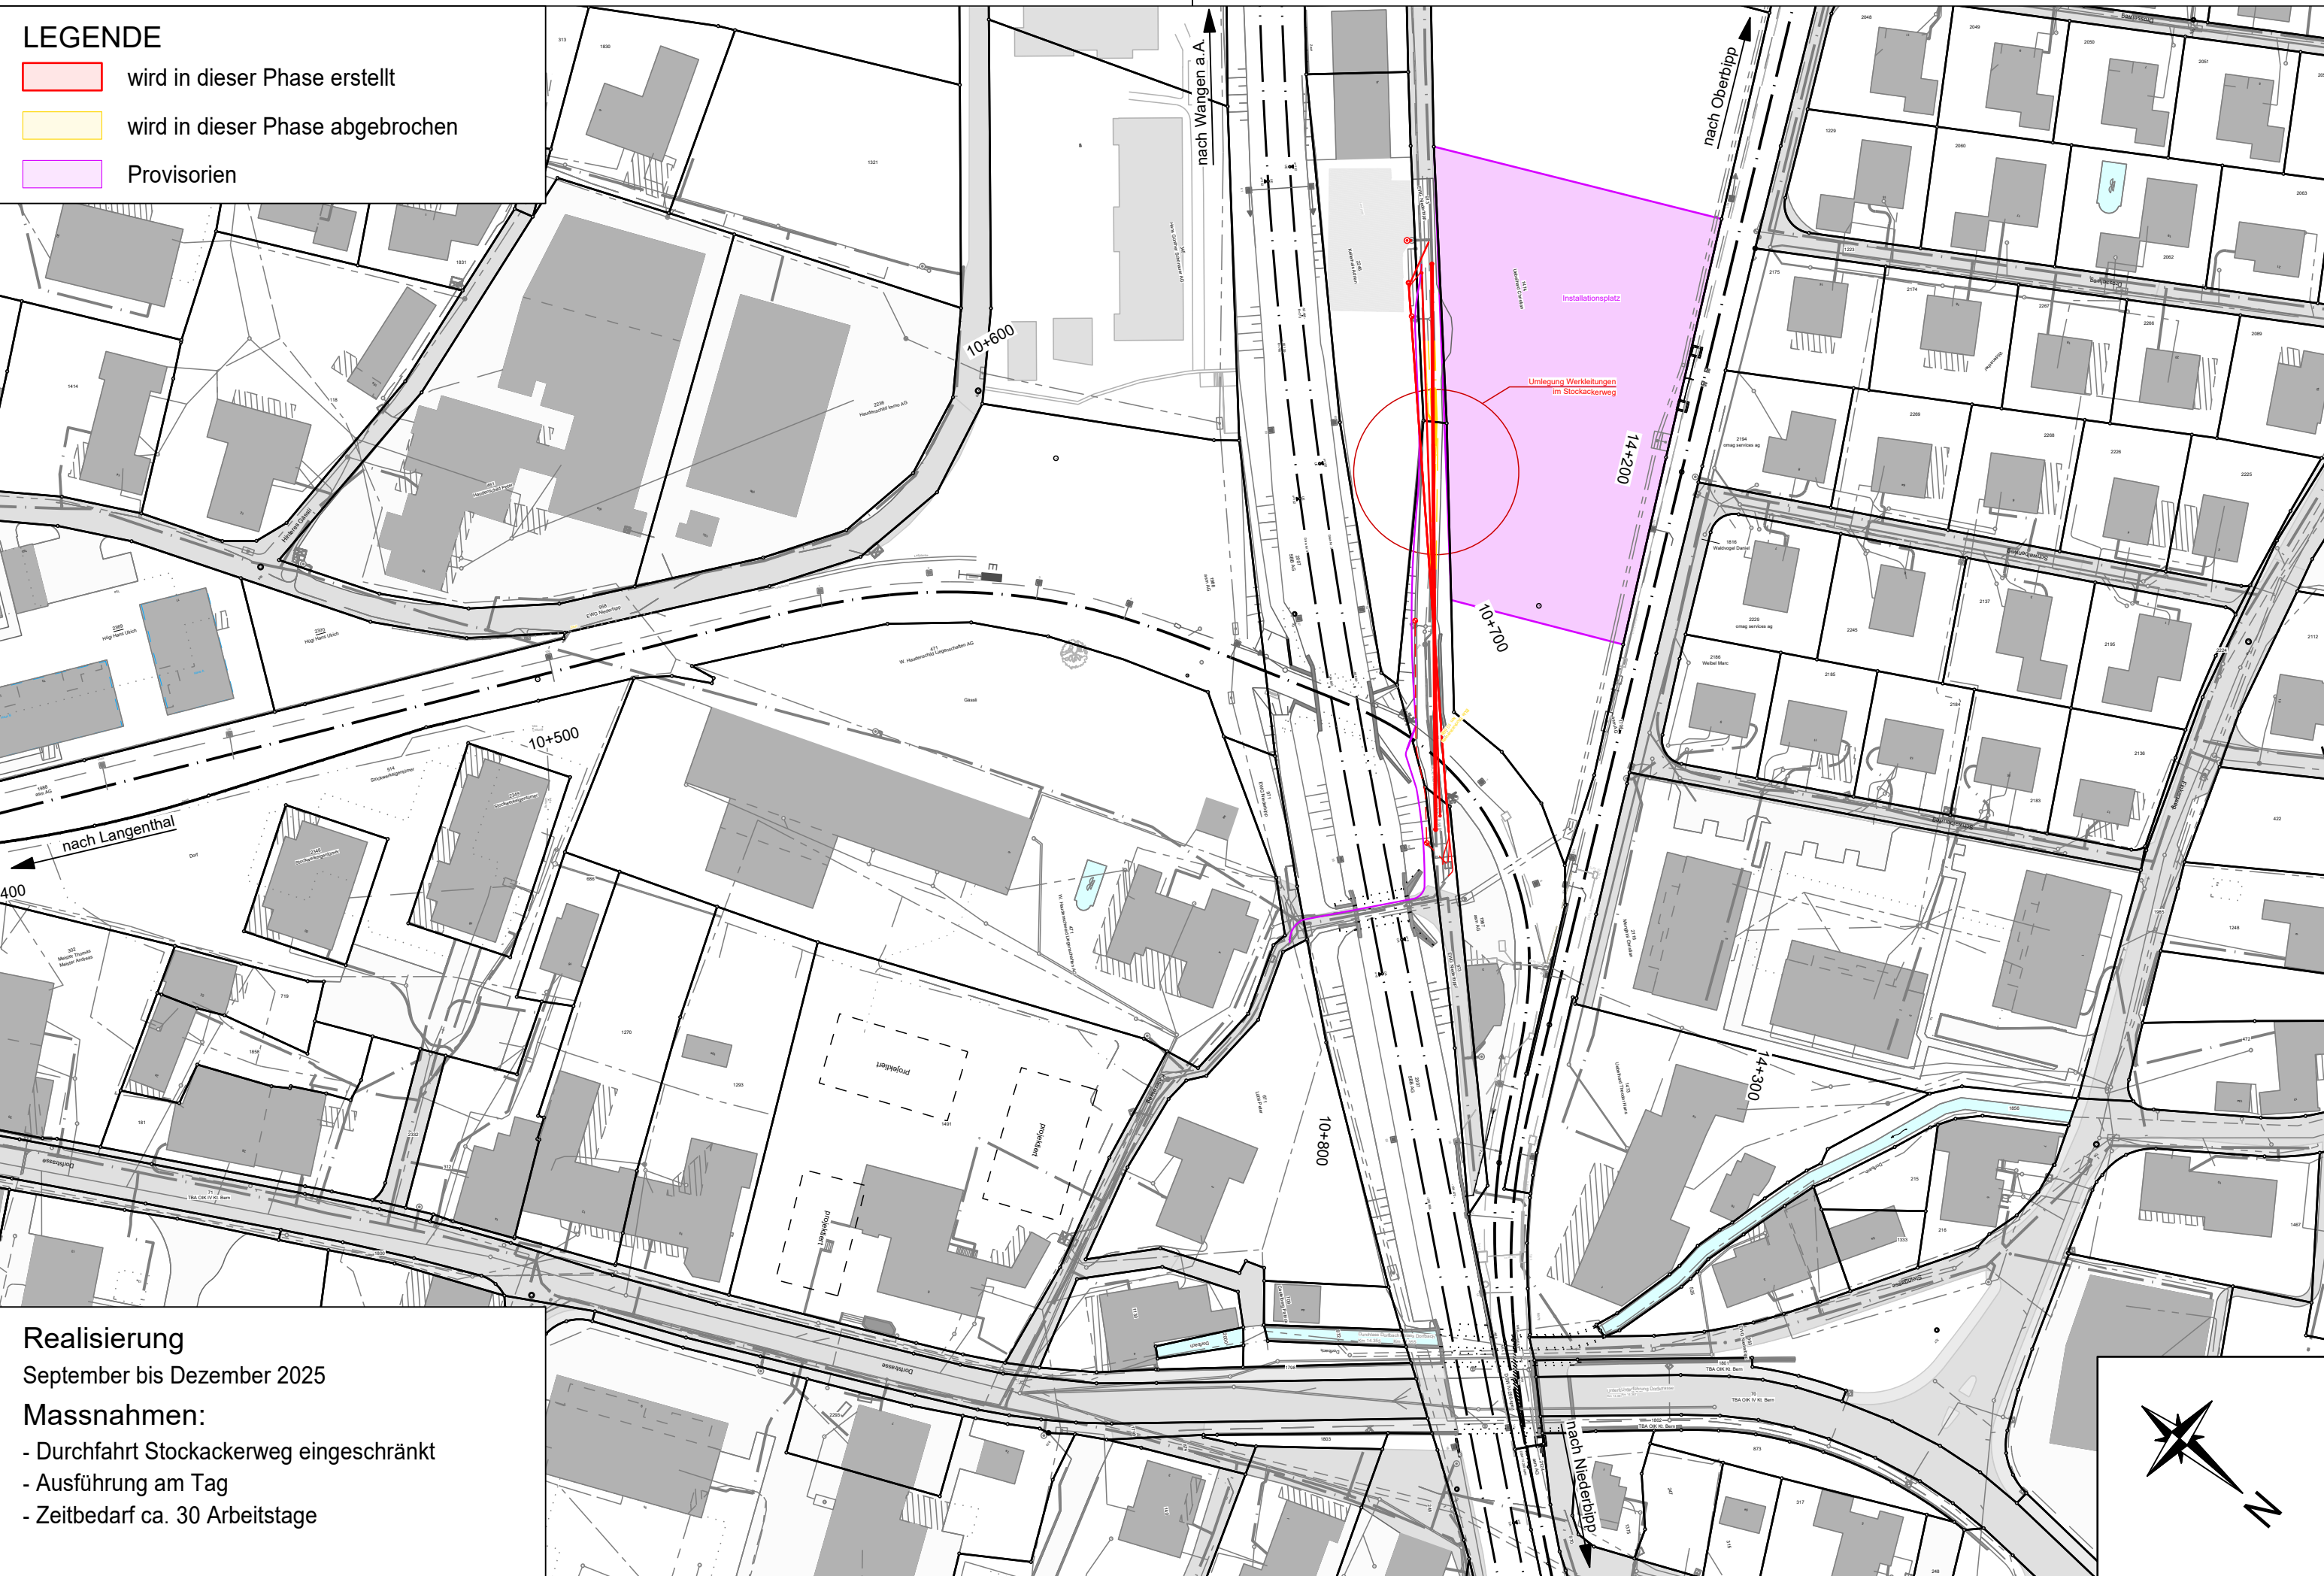


Kanton: Bern
Gemeinde: Niederbipp
Bahnlinie: 413
Bahnkilometer: km 9.750 - km 10.775

asm - Nummer: 10 1000 81

Projekt-Titel: Erneuerung Scharnageln - Niederbipp


Projektphase: **Ausführungsprojekt**
Inhalt: Bauphasenplan 2 1:1'000
Phase 2

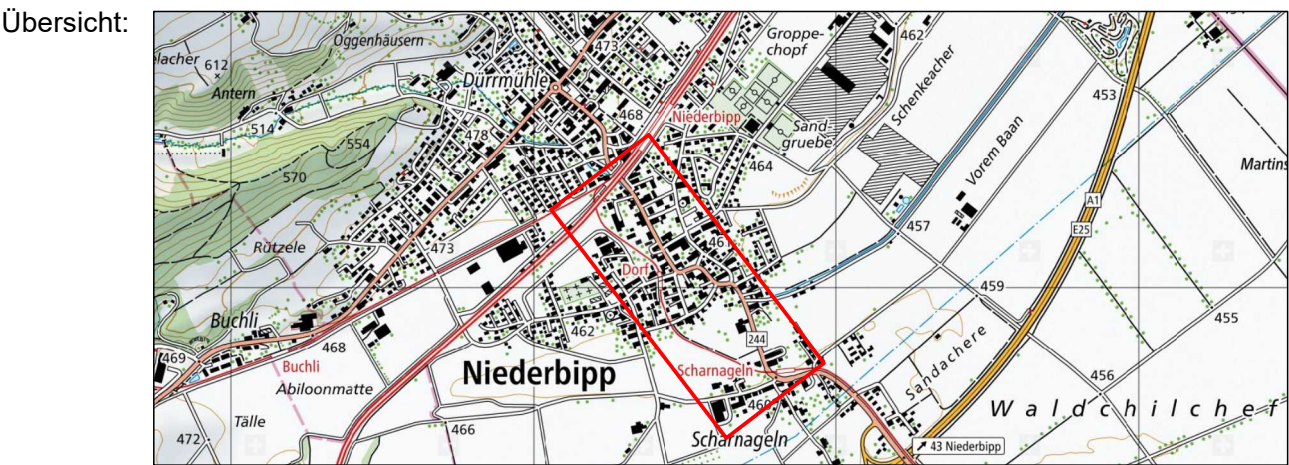

Auftrag Nr. 20068	Auftraggeber:	Projektverfasser:
Plan Nr: 20068_25_2	Aare Seeland mobil AG Grubenstrasse 12 4900 Langenthal Gesamtprojektleiter / Projektleiter: Martin Mühlethaler Telefon 058 329 93 93 martin.muehlethaler@asmobil.ch	IG CESO c/o c+s ingenieure ag Kalchofenstrasse 20 3415 Hasle b.B. Projektleiter: Stephan Steiner Telefon 034 460 26 26 stephan.steiner@csing.ch
Datum: 17.09.2025		
Format: 630 x 297 mm		
gez/kontr: CBI / SST		
Änderungen:		



- LEGENDE
- wird in dieser Phase erstellt (Phase 2)
 - wird in dieser Phase erstellt (Phase 4)
 - wird in dieser Phase abgebrochen
 - wurde in einer vorherigen Phase erstellt
 - Provisorien

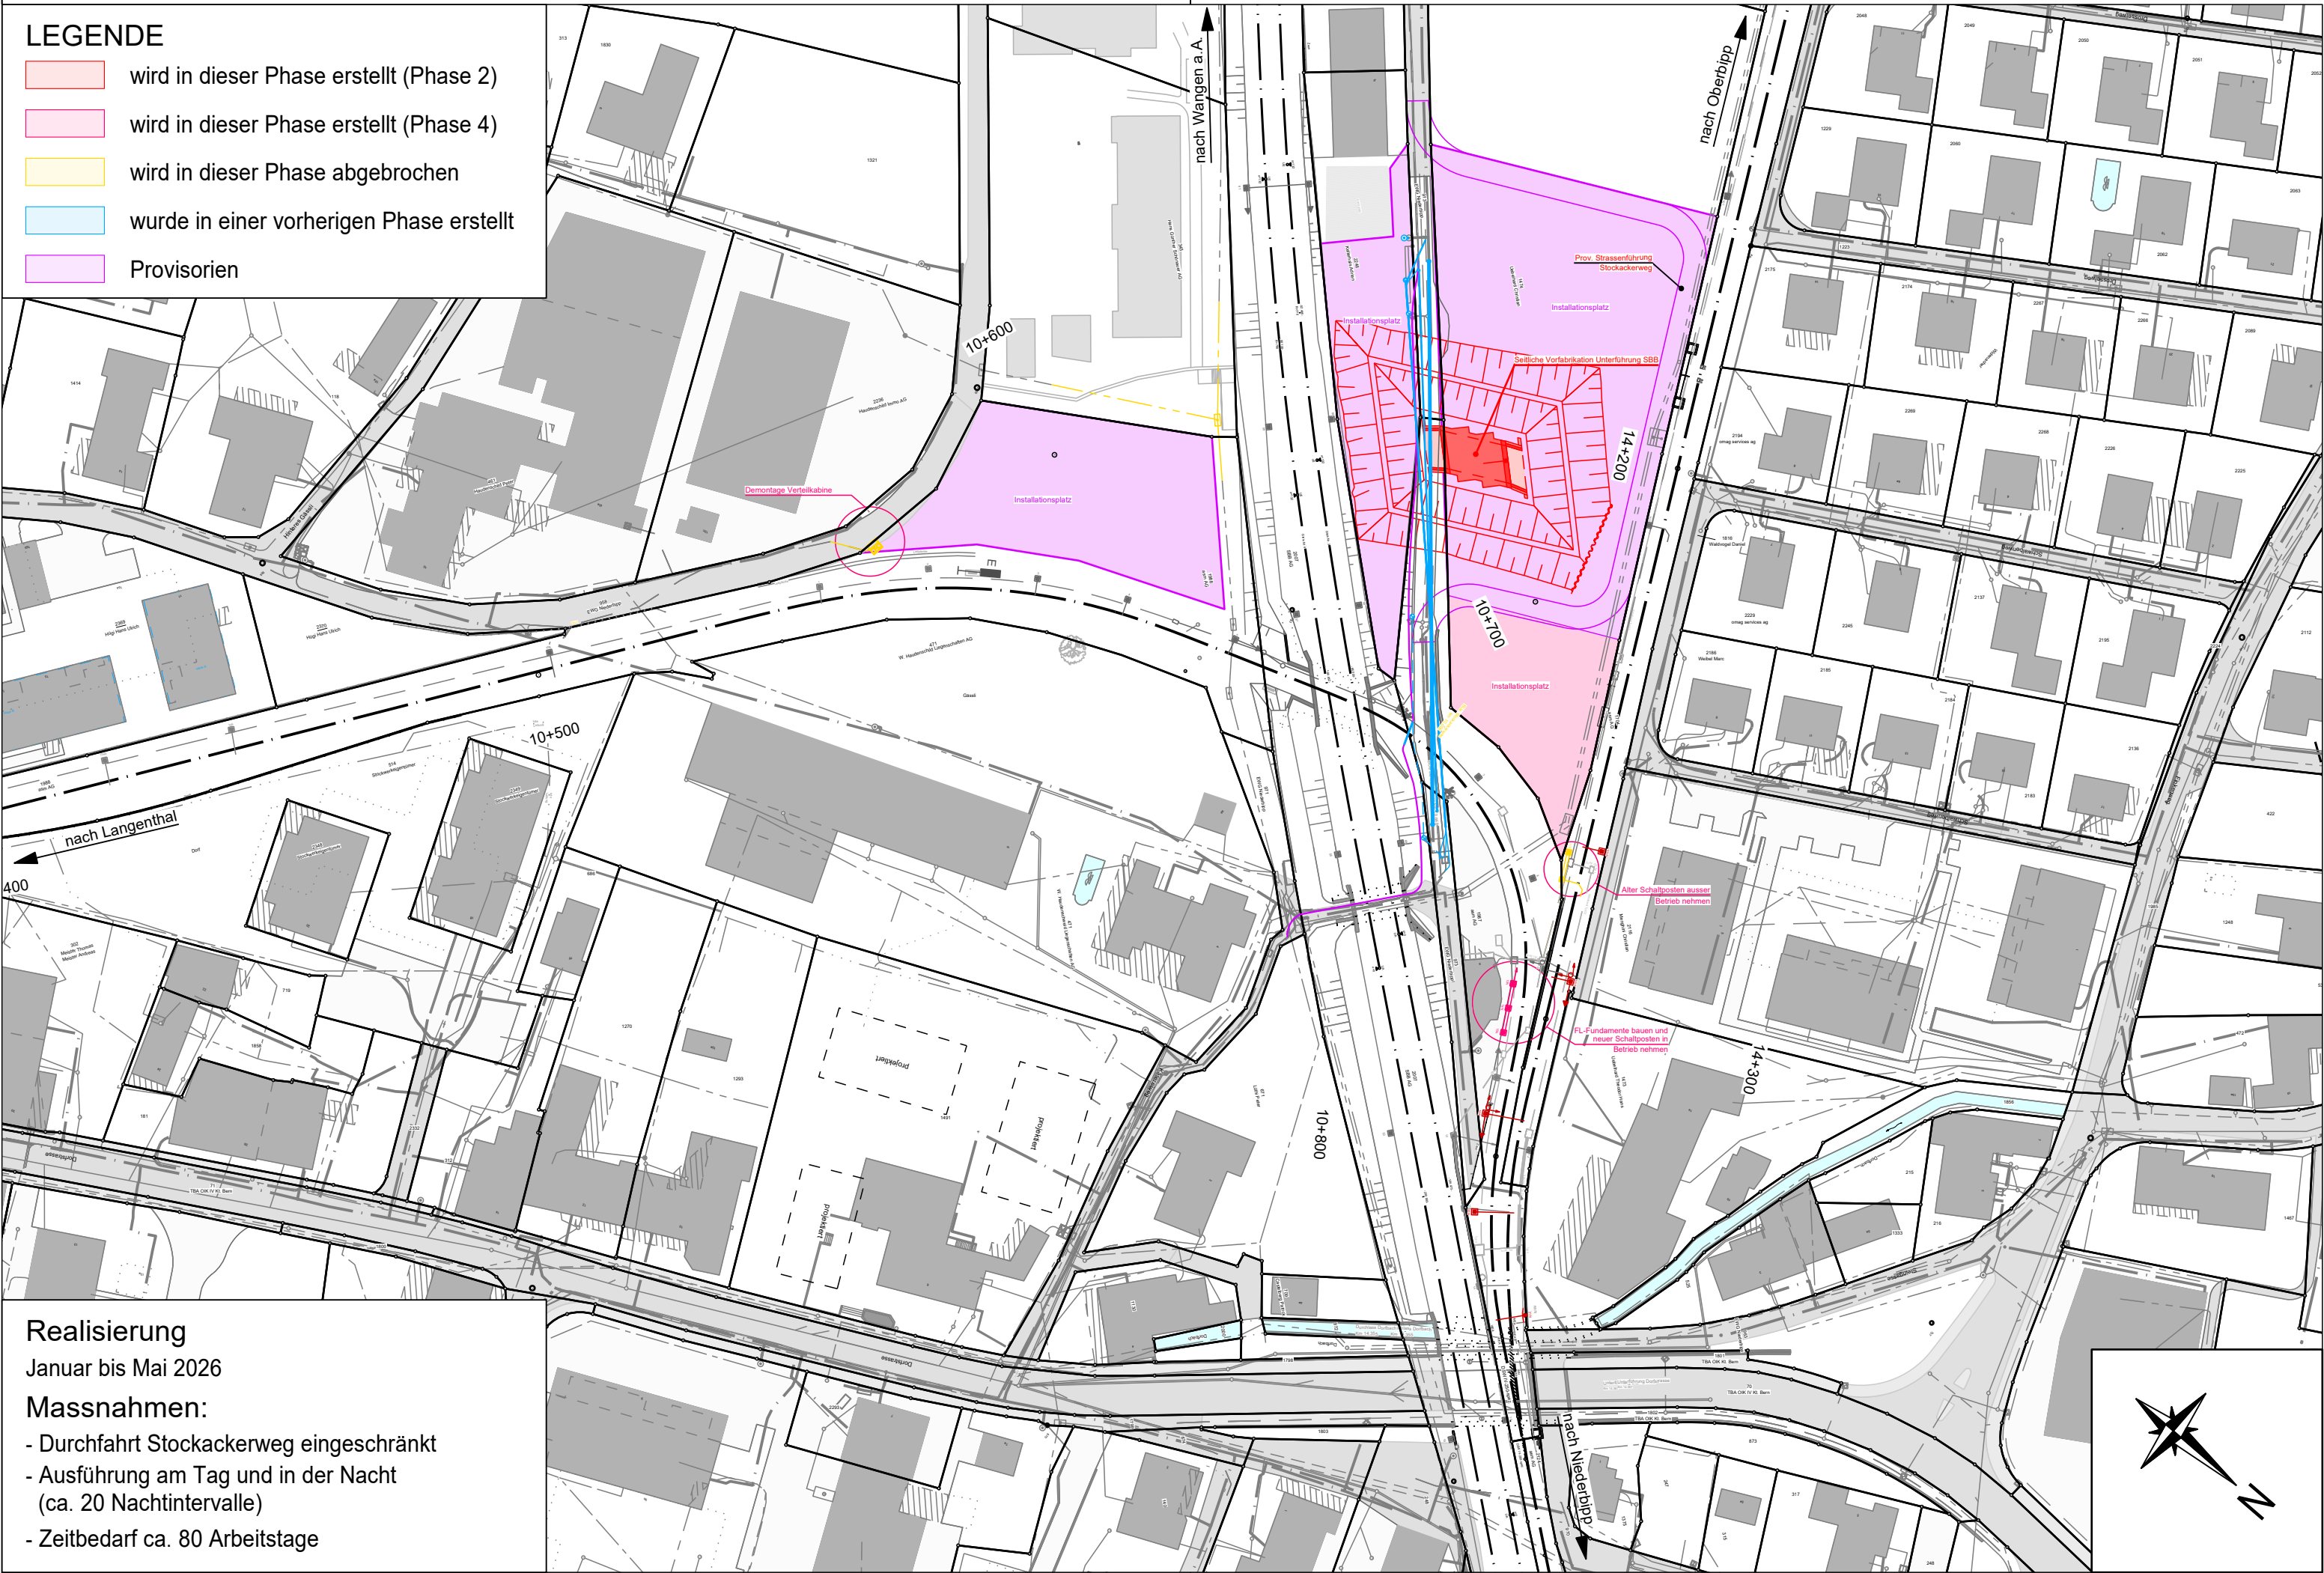


Realisierung
Januar bis Mai 2026
Massnahmen:
- Durchfahrt Stockackerweg eingeschränkt
- Ausführung am Tag und in der Nacht (ca. 20 Nachtintervalle)
- Zeitbedarf ca. 80 Arbeitstage

Kanton: Bern
Gemeinde: Niederbipp
Bahnlinie: 413
Bahnkilometer: km 9.750 - km 10.775


asm - Nummer: 10 1000 81

Projekt-Titel: Erneuerung Scharnageln - Niederbipp

Projektphase: **Ausführungsprojekt**
Inhalt: Bauphasenplan 4 1:1'000
Phase 4

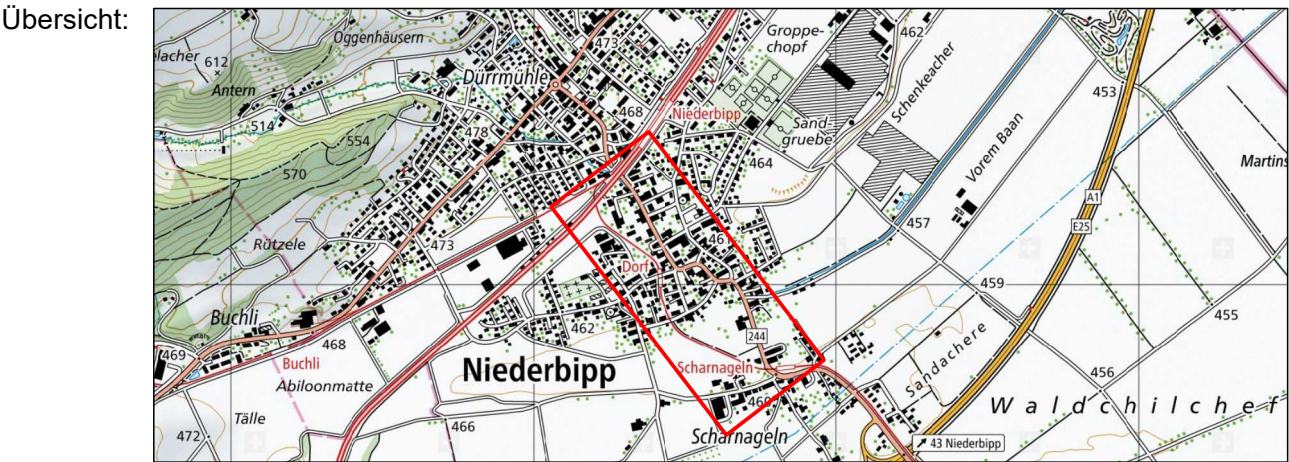

Auftrag Nr. 20068	Auftraggeber:	Projektverfasser:
Plan Nr: 20068_25_4	Aare Seeland mobil AG Grubenstrasse 12 4900 Langenthal Gesamtprojektleiter / Projektleiter: Martin Mühlethaler Telefon 058 329 93 93 martin.muehlethaler@asmobil.ch	IG CESO c/o c+s ingenieure ag Kalchofenstrasse 20 3415 Hasle b.B. Projektleiter: Stephan Steiner Telefon 034 460 26 26 stephan.steiner@csing.ch
Datum: 17.09.2025		
Format: 630 x 297 mm		
gez/kontr: CBI / SST		
Änderungen:		

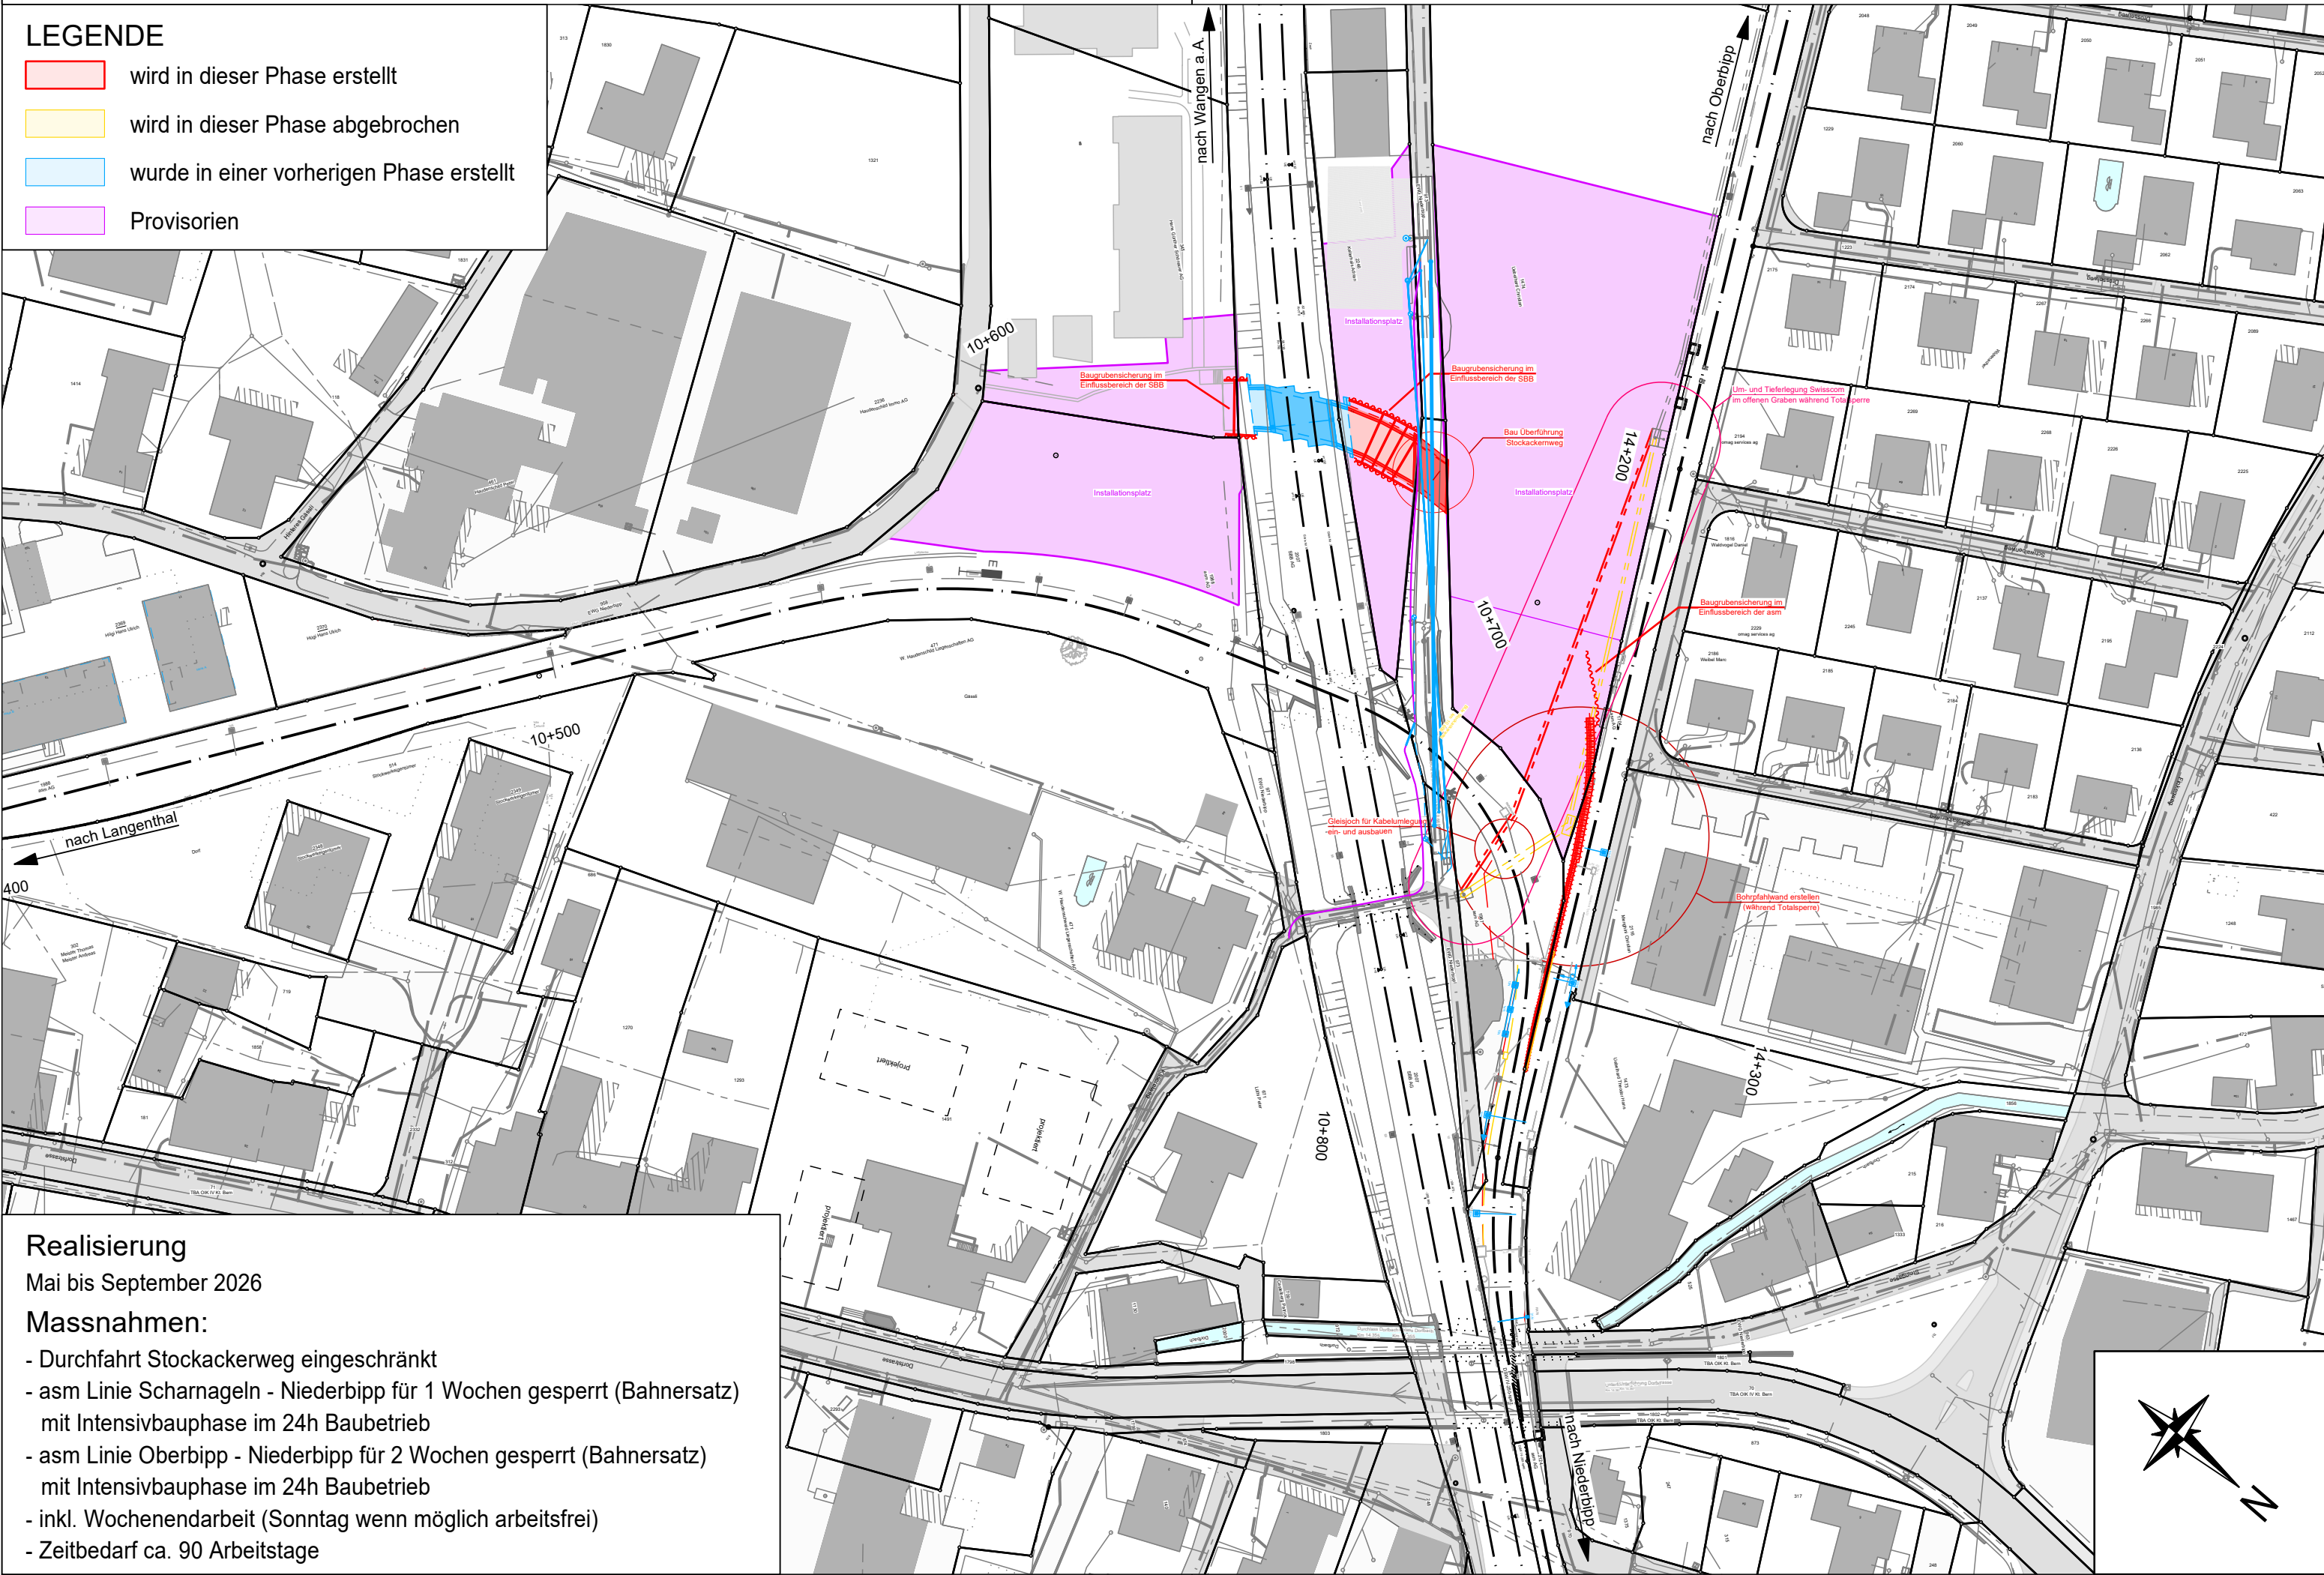

Realisierung
Mai bis September 2026
Massnahmen:

- Durchfahrt Stockackerweg eingeschränkt
- asm Linie Scharnageln - Niederbipp für 1 Wochen gesperrt (Bahnersatz) mit Intensivbauphase im 24h Baubetrieb
- asm Linie Oberbipp - Niederbipp für 2 Wochen gesperrt (Bahnersatz) mit Intensivbauphase im 24h Baubetrieb
- inkl. Wochenendarbeit (Sonntag wenn möglich arbeitsfrei)
- Zeitbedarf ca. 90 Arbeitstage

Kanton: Bern
Gemeinde: Niederbipp
Bahnlinie: 413
Bahnkilometer: km 9.750 - km 10.775




08.07

asm - Nummer: 10 1000 81

Projekt-Titel: Erneuerung Scharnageln - Niederbipp

Projektphase: Ausführungsprojekt


Inhalt: Bauphasenplan 5 1:1'000
Phase 5

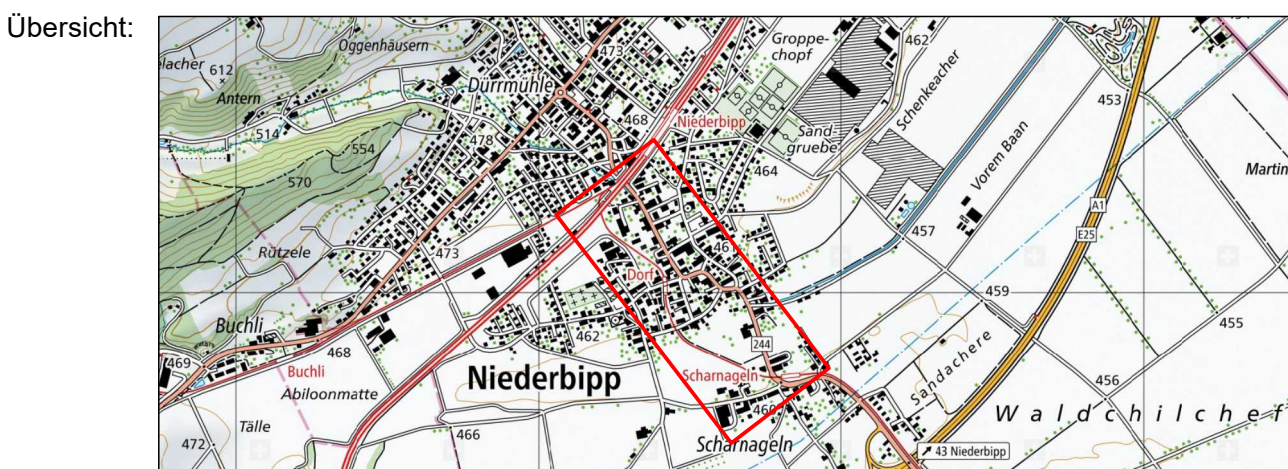

Auftrag Nr. 20068	Auftraggeber:	Projektverfasser:
Plan Nr: 20068_25_5		
Datum: 17.09.2025	Aare Seeland mobil AG Grubenstrasse 12 4900 Langenthal	IG CESO c/o c+s ingenieure ag Kalchofenstrasse 20 3415 Hasle b.B.
Format: 1260 x 297 mm	Gesamtprojektleiter / Projektleiter: Martin Mühlethaler Telefon 058 329 93 93 martin.muehlethaler@asmobil.ch	Projektleiter: Stephan Steiner Telefon 034 460 26 26 stephan.steiner@casing.ch
gez/kontr: CBI / SST		
Änderungen:		

LEGENDE

- wird in dieser Phase erstellt
- wird in dieser Phase abgebrochen
- wurde in einer vorherigen Phase erstellt
- Provisorien

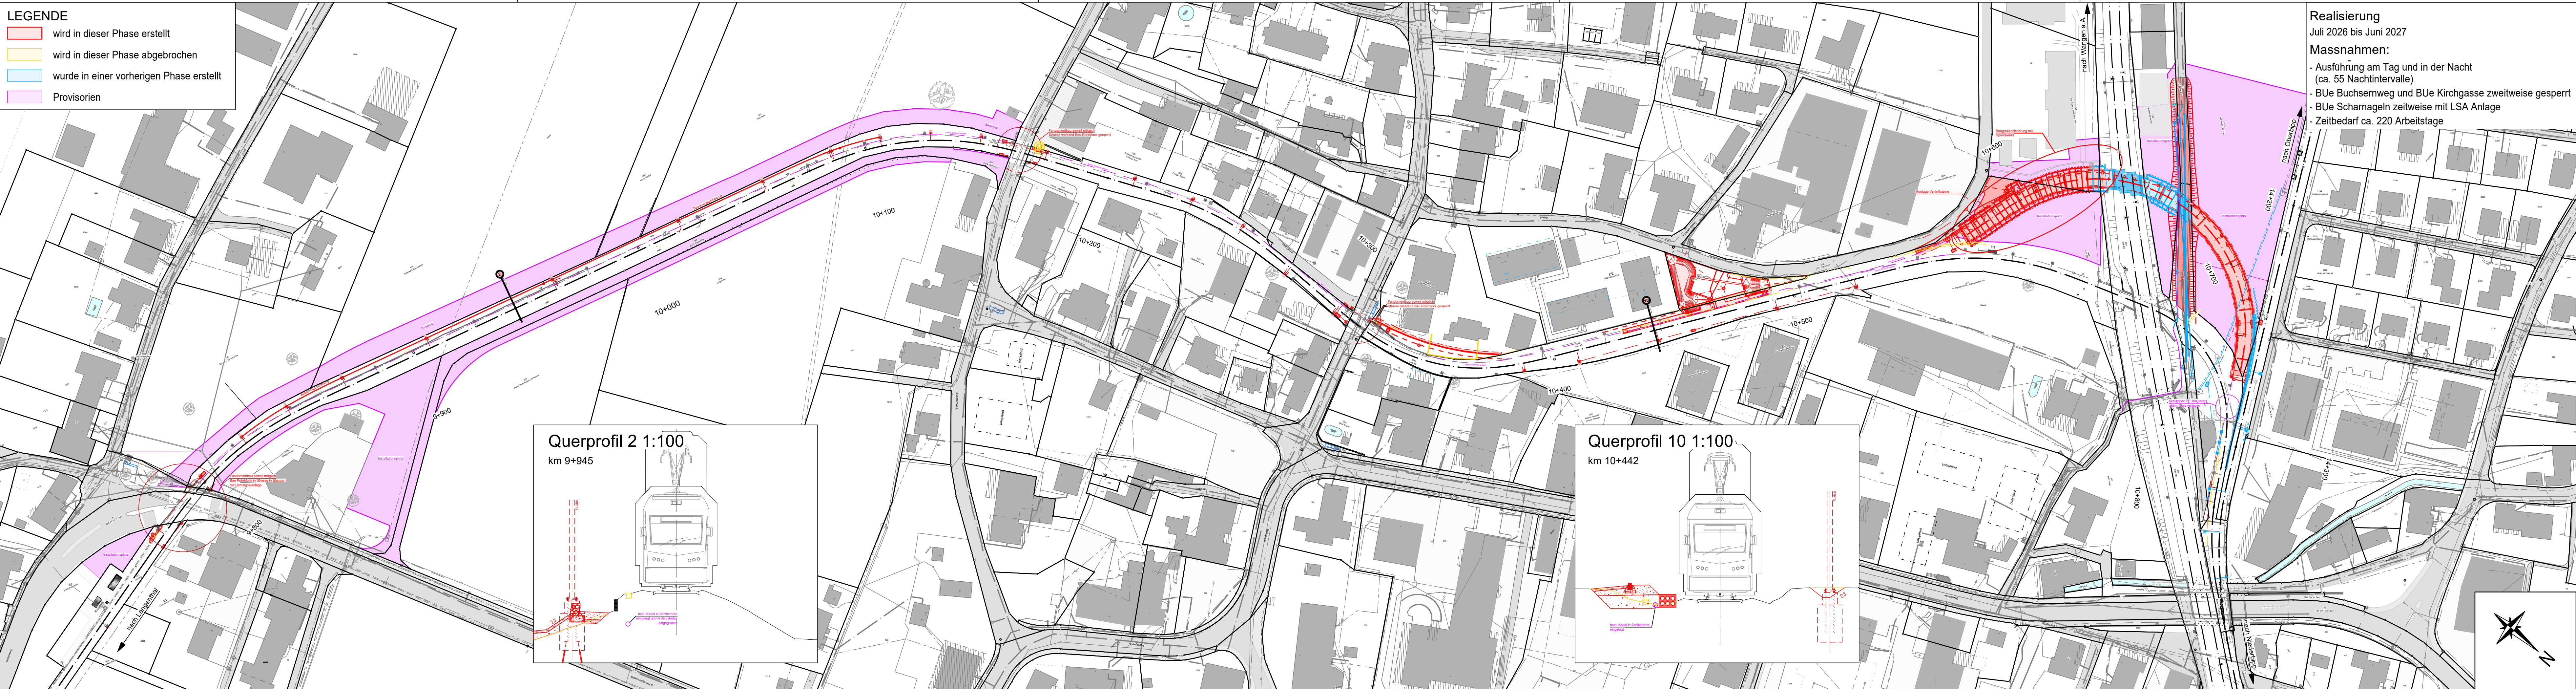

Realisierung

Juli 2026 bis Juni 2027

Massnahmen:

- Ausführung am Tag und in der Nacht (ca. 55 Nachtintervalle)
- BUe Buchserweg und BUe Kirchgasse zeitweise gesperrt
- BUe Scharnageln zeitweise mit LSA Anlage
- Zeitbedarf ca. 220 Arbeitstage

Kanton: Bern
Gemeinde: Niederbipp
Bahnlinie: 413
Bahnkilometer: km 9.750 - km 10.775




08.08

asm - Nummer: 10 1000 81

Projekt-Titel: Erneuerung Scharnageln - Niederbipp

Projektphase: Ausführungsprojekt


Inhalt: Bauphasenplan 6 1:1'000
Phase 6

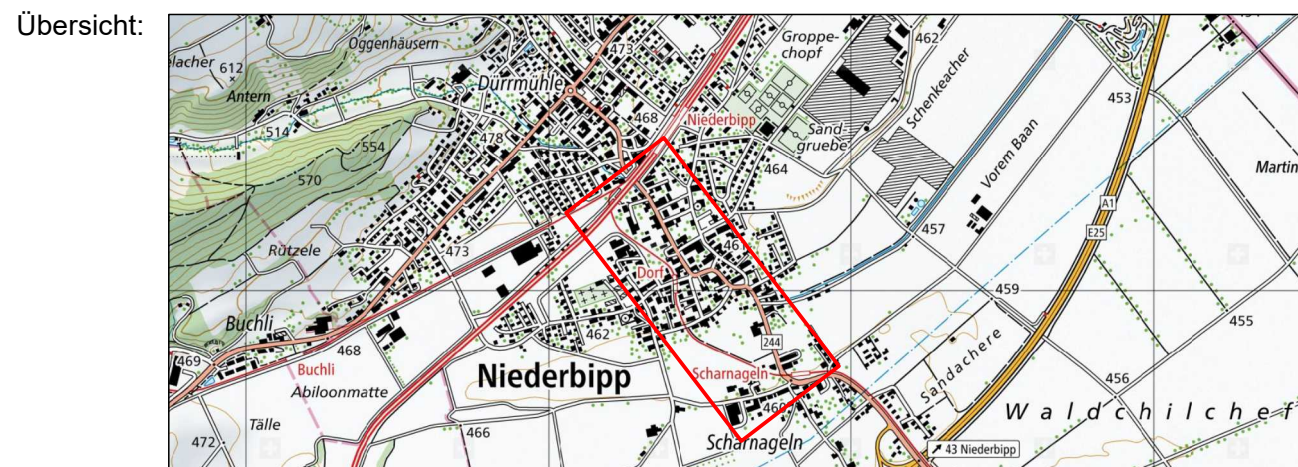

Auftrag Nr. 20068	Auftraggeber:	Projektverfasser:
Plan Nr: 20068_25_6		
Datum: 17.09.2025	Aare Seeland mobil AG Grubenstrasse 12 4900 Langenthal	IG CESO c/o c+s ingenieure ag Kalchofenstrasse 20 3415 Hasle b.B.
Format: 1260 x 297 mm	Gesamtprojektleiter / Projektleiter: Martin Mühlethaler Telefon 058 329 93 93 martin.muehlethaler@asmobil.ch	Projektleiter: Stephan Steiner Telefon 034 460 26 26 stephan.steiner@casing.ch
Änderungen:		

LEGENDE

- wird in dieser Phase erstellt
- wird in dieser Phase abgebrochen
- wurde in einer vorherigen Phase erstellt
- Provisorien

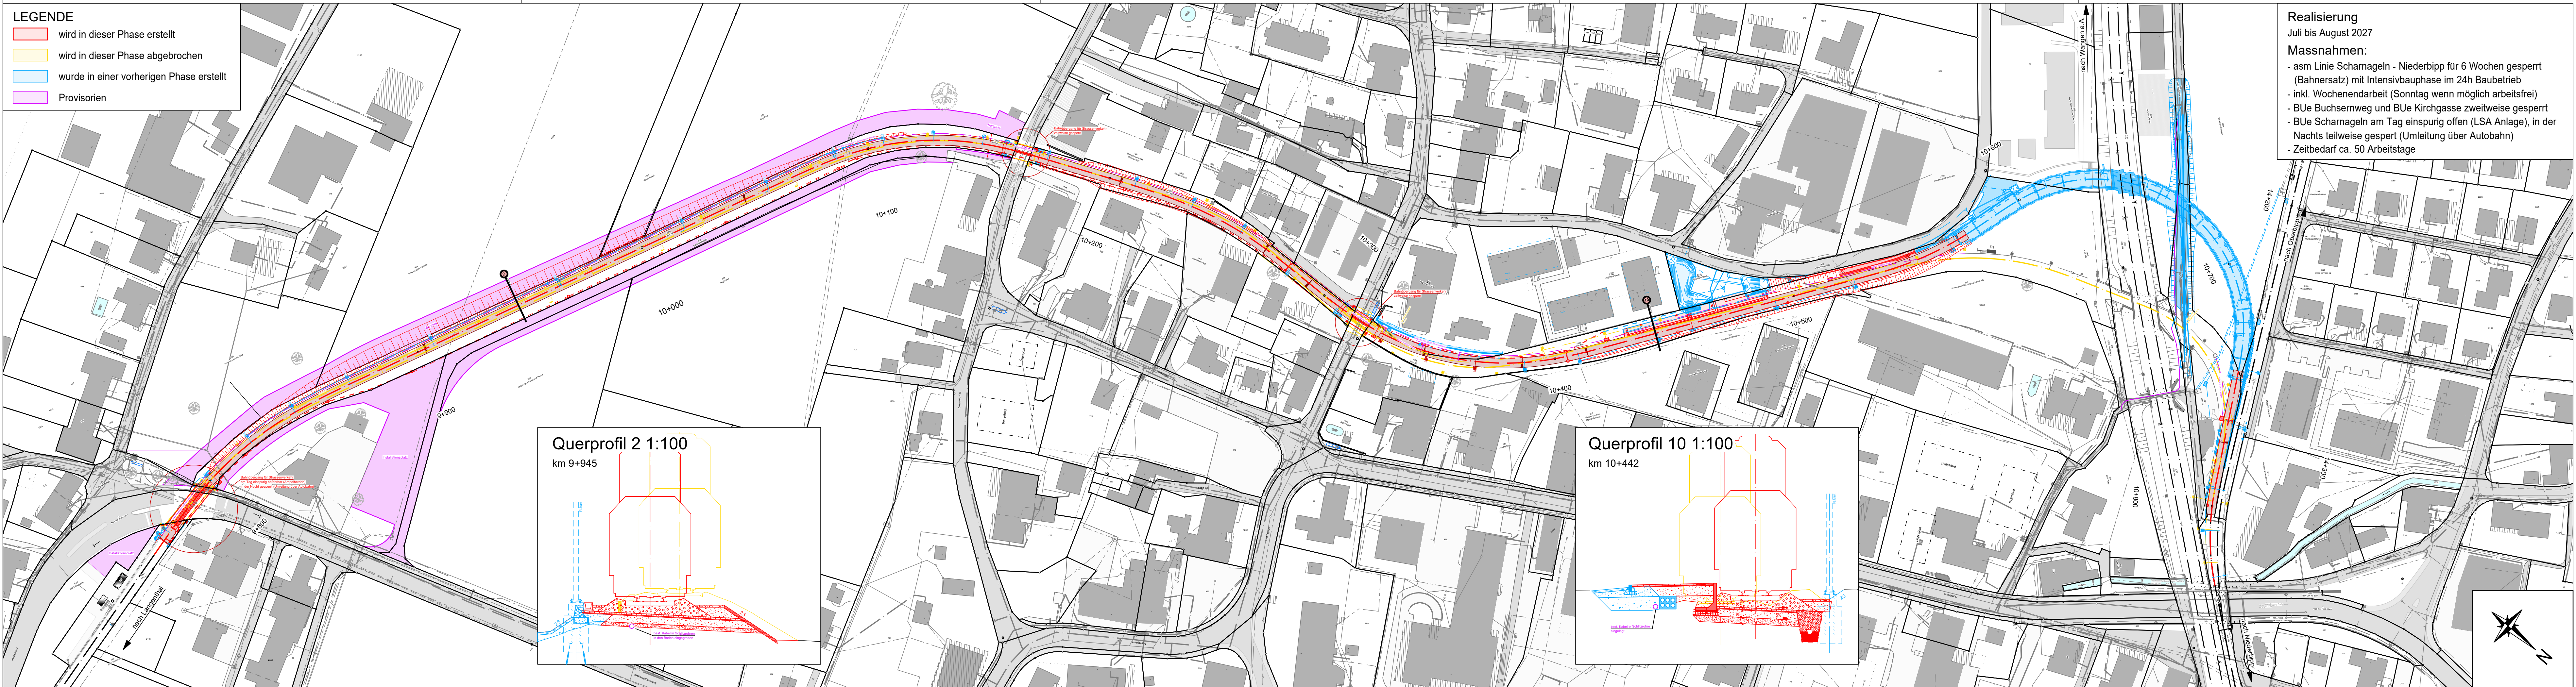

Realisierung

Juli bis August 2027

Massnahmen:

- asm Linie Scharnageln - Niederbipp für 6 Wochen gesperrt (Bahnersatz) mit Intensivbauphase im 24h Baubetrieb
- inkl. Wochenendarbeit (Sonntag wenn möglich arbeitsfrei)
- BUe Buchserweg und BUe Kirchgasse zweitweise gesperrt
- BUe Scharnageln am Tag einspurig offen (LSA Anlage), in der Nachts teilweise gesperrt (Umleitung über Autobahn)
- Zeitbedarf ca. 50 Arbeitstage

Kanton: Bern
Gemeinde: Niederbipp
Bahnlinie: 413
Bahnkilometer: km 9.750 - km 10.775




08.11

asm - Nummer: 10 1000 81

Projekt-Titel: Erneuerung Scharnageln - Niederbipp

Projektphase: Ausführungsprojekt


Inhalt: Bauphasenplan 7 1:1'000
Phase 7

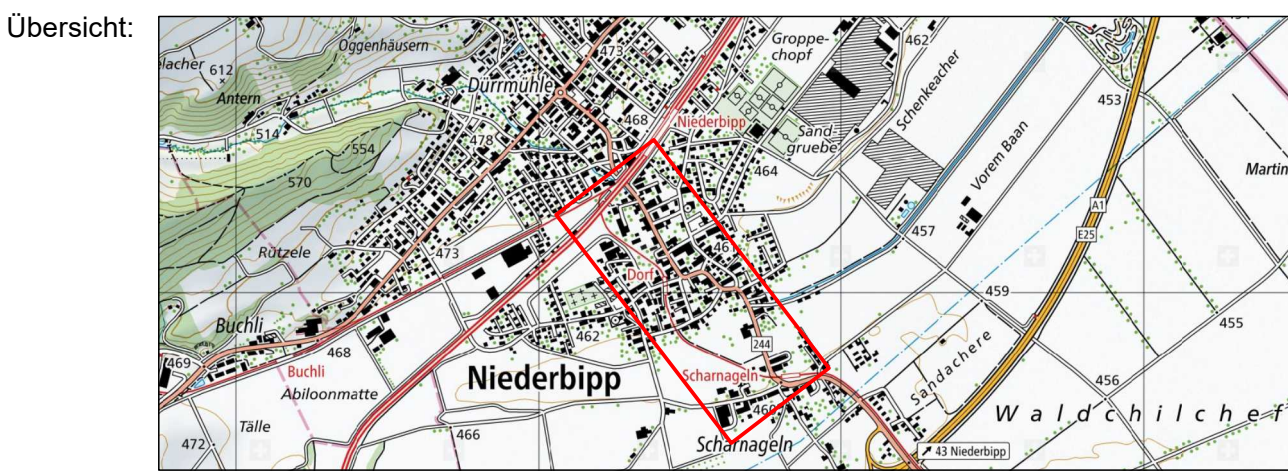

Auftrag Nr. 20068	Auftraggeber:	Projektverfasser:
Plan Nr: 20068_25_7		
Datum: 17.09.2025	Aare Seeland mobil AG Grubenstrasse 12 4900 Langenthal	IG CESO c/o c+s ingenieure ag Kalchofenstrasse 20 3415 Hasle b.B.
Format: 1260 x 297 mm	Gesamtprojektleiter / Projektleiter: Martin Mühlethaler Telefon 058 329 93 93 martin.muehlethaler@asmobil.ch	Projektleiter: Stephan Steiner Telefon 034 460 26 26 stephan.steiner@casing.ch
Änderungen:		

LEGENDE

- wird in dieser Phase erstellt
- wird in dieser Phase abgebrochen
- wurde in einer vorherigen Phase erstellt
- Provisorien

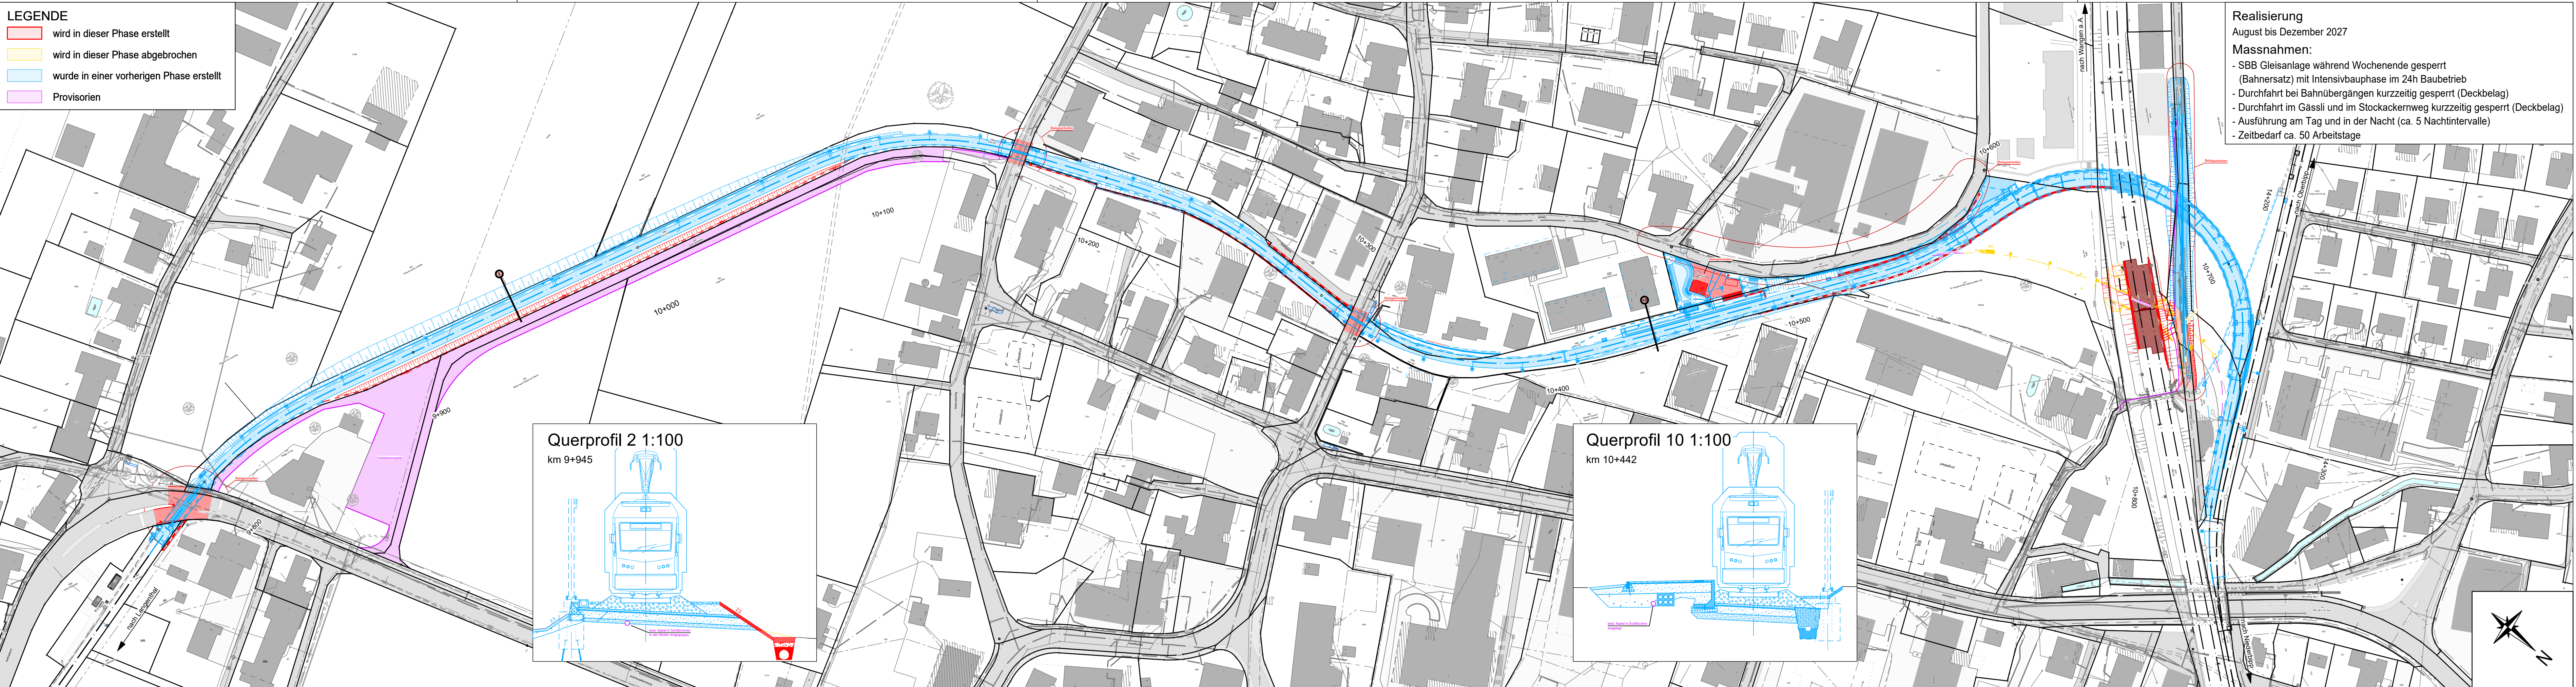

Realisierung

August bis Dezember 2027

Massnahmen:

- SBB Gleisanlage während Wochenende gesperrt (Bahnersatz) mit Intensivbauphase im 24h Baubetrieb
- Durchfahrt bei Bahnübergängen kurzzeitig gesperrt (Deckbelag)
- Durchfahrt im Gässli und im Stockackerweg kurzzeitig gesperrt (Deckbelag)
- Ausführung am Tag und in der Nacht (ca. 5 Nachtintervalle)
- Zeitbedarf ca. 50 Arbeitstage
